

BTS SIO - Épreuve E5

Livrable 4 - Travailler en mode projet

Candidat	ELISME B'dwin
Niveau	BTS SIO - 2e année
Nature du document	Captures d'écran et commentaires techniques
Usage	Support de présentation pour l'épreuve E5

Livrable 4 - Travailler en mode projet

Ce livrable rassemble les captures d'écran utiles et les commentaires techniques permettant de justifier les activités associées à cette compétence E5.

Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet

Réalisation présentée : Utilisation d'un cahier des charges pour cadrer les objectifs du projet.

Analyser les objectifs et les modalités d'organisation d'un projet (cahier des charges)	
Rubrique	Contenu synthétique
Objectifs du projet	• Créer le site <i>garage-family.fr</i> • Intégrer un système de réservation en ligne • Présenter les services du garage • Mettre en place une base de données fiable (Supabase)
Analyse du besoin	• Digitaliser la prise de rendez-vous • Centraliser le planning du garage • Avoir un site clair, responsive et professionnel • Garantir la sécurité des données clients
Contraintes techniques	• Utilisation de Supabase (DB + auth) • Base de code existante mais mal faite → refonte nécessaire • Problèmes : schémas incohérents, API non fonctionnelles, bugs sur la réservation
Contraintes organisationnelles	• Durée prévue : 1 mois • Durée réelle : 1 mois et demi • Retard dû à la reconstruction quasi totale du système de réservation
Livrables attendus	• Site fonctionnel • Système de réservation fiable • Base Supabase corrigée et stable • Interface admin du planning • Documentation technique + schémas

Commentaire technique associé à la capture :

La capture rattache l'activité au cadrage projet. Le cahier des charges permet de formaliser le besoin, les contraintes, les livrables attendus et les modalités d'organisation avant la réalisation.

Points techniques à valoriser :


- Formalisation du besoin et des objectifs.
- Identification des contraintes et livrables attendus.
- Base de référence pour suivre la réalisation du projet.

Planifier les activités avec un diagramme de Gantt

Réalisation présentée : Planification des tâches, définition des jalons et répartition des actions.



- Planning des tâches
- Définition des jalons
- Répartition des actions

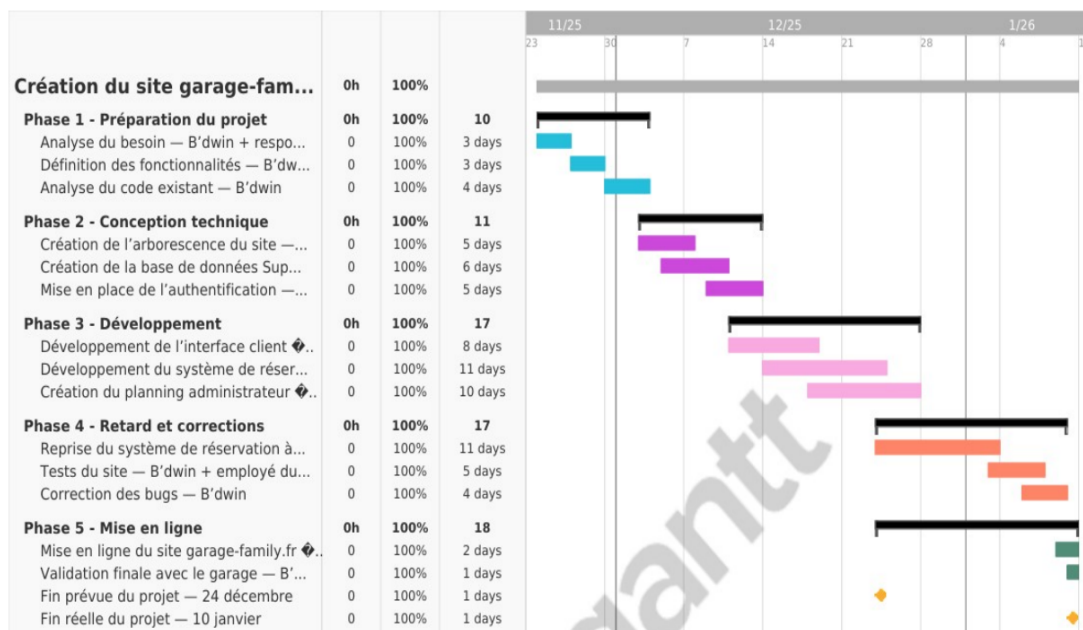

Commentaire technique associé à la capture :


Les captures montrent une démarche de planification. Le diagramme de Gantt permet de visualiser les tâches, leur durée, leur ordre d'exécution et les jalons importants du projet.

Points techniques à valoriser :

- Découpage du projet en tâches.
- Planification dans le temps avec jalons.
- Suivi de l'avancement et des dépendances entre activités.

Évaluer les indicateurs de suivi et analyser les écarts

Réalisation présentée : Analyse d'un écart entre durée prévue et durée réelle, avec identification de la cause du retard.

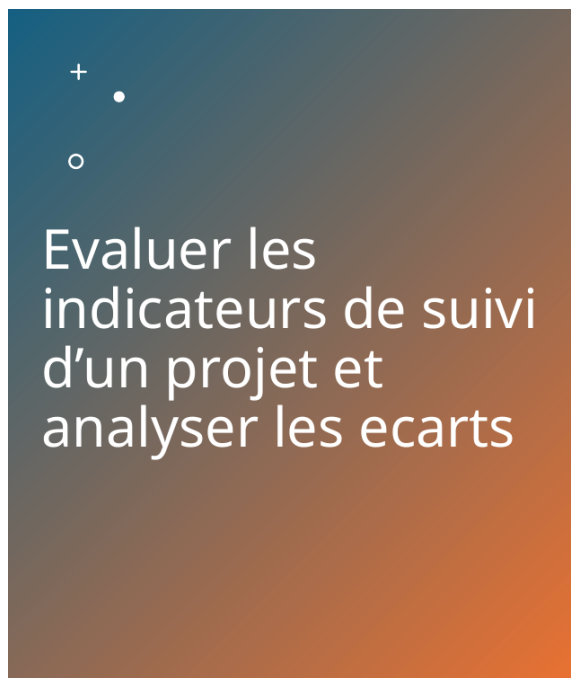

- **Contraintes organisationnelles**

- • Durée prévue : 1 mois • Durée réelle : 1 mois et demi

- **Écart constaté :**

la tâche « **Développement du système de réservation** » a entraîné un retard de 17 jours,

- **Cause :**

base de code existante mal structurée, corriger les schémas Supabase, de stabiliser les API et de résoudre les bugs

Commentaire technique associé à la capture :

La capture présente un suivi projet réaliste : la durée prévue était d'un mois, la durée réelle d'un mois et demi, avec un retard de 17 jours lié au développement du système de réservation. L'analyse de l'écart permet de comprendre les causes techniques et d'ajuster le pilotage du projet.

Points techniques à valoriser :

- Comparaison entre planning prévu et réalisation réelle.
- Identification d'un écart de délai de 17 jours.
- Analyse des causes : code existant, schémas Supabase, API et bugs.
